
关于军事馆局部与原设计不符
请求补充检测鉴定范围的函件


致广西壮族自治区烈士陵园（广西革命纪念馆）：

根据现场提供的工程联系函（编号：GJ-041），根据《既有建筑鉴定与加固通用规范》GB55021-2021（全文强制性工程建设规范）1.0.3 的要求，既有建筑的鉴定与加固，应遵循先检测、鉴定，后加固设计、施工与验收的原则。现请求补充对如下范围进行检测鉴定。

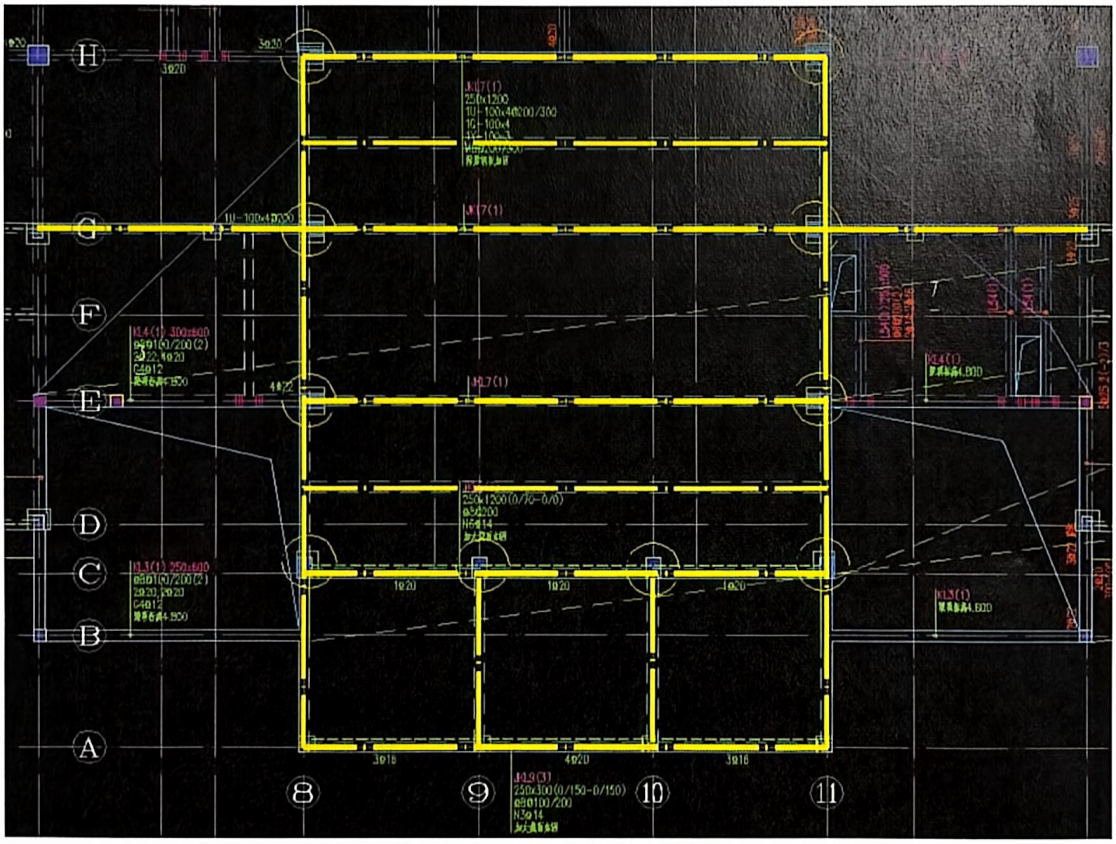

二层平面

其中，梁需检测鉴定范围为黄色虚线处，柱需检测鉴定范围为黄色圆圈处，需并提供现场结构布置含关于轴线定位、构件截面尺寸和配筋以及材料强度以供修改加固设计。

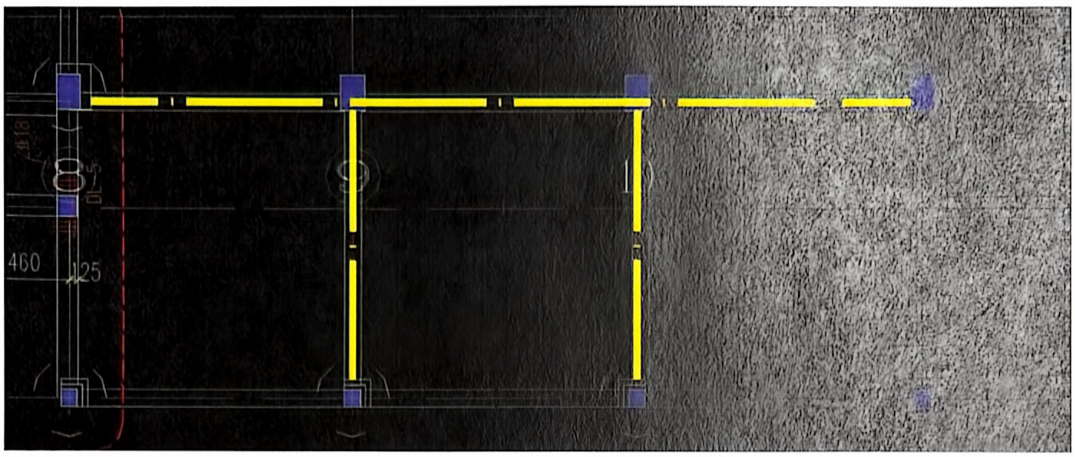

基础平面

其中，基础需检测鉴定范围为黄色虚线处地梁及 8 交 C、11 交 C 处基础，需提供现场结构布置含构件关于轴线定位、构件截面尺寸和配筋以及材料强度以供修改加固设计。

以上检测范围需提供局部鉴定报告以作为加固设计依据。

望回复为盼。

天尚设计集团有限公司

2026 年 08 月 27 日

抄送：广西中信恒泰工程顾问有限公司
